COMUNE di: MARCARIA **PROVINCIA di: MANTOVA**

CERTIFICATO
DI
COLLAUDO TECNICO DEFINITIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVA " SCAINA DUE " A CAMPITELLO
AD INIZIATIVA DELLE DITTE: IMMOB. FIORENZA S.R.L. E GABOGAS 2 S.A.S
(art. N° 5 della Convenzione Urbanistica Rep. n° 3408 in data 02/07/2004)

A) PREMESSE

Nella predisposizione del presente Certificato di Collaudo definitivo si è tenuto conto che:

1.Le opere di urbanizzazione del comparto sono iniziate nel lontano anno 2007 e si sono protratte per la sopraggiunta congiuntura del mercato immobiliare e degli insediamenti produttivi;

2.Nel frattempo è stato redatto dal sottoscritto un Certificato di Collaudo Tecnico Parziale in data 25/10/2013, per consentire l'esercizio funzionale di una nuova attività artigianale;

3.Nell' anno 2016 è stata predisposta dai lottizzanti la segnaletica e la illuminazione stradale, consentendo la regolare fruizione ad anello della via G. Rossini, svincolando una parte dell'abitato;

4.Da circa un quinquennio quindi la viabilità è aperta regolarmente al traffico comunale e si registra necessariamente una certa usura nelle pavimentazioni e nella segnaletica superficiale;

5.Sono state concordate verbalmente e consentite dall' Amministrazione alcune rettifiche compensative e non sostanziali quali:

a) la pavimentazione della aiuola a che delimita la pista ciclabile a nord del comparto, escludendo la siepe e la relativa tubazione di innaffiamento;

b) la esclusione del tratto di aiuola ad est, sostituendola con la linea di segnaletica orizzontale per evitare un eccessivo restringimento della carreggiata veicolare sul tratto di strada di penetrazione, preesistente dalla Strada Provinciale Sabbionetana;

c) la esecuzione di alcuni tagli stradali ad iniziativa di Operatori sopravvenuti ultimamente nell' insediamento, che hanno realizzato il ripristino dopo gli assestamenti della massicciata.

6.Nel tempo trascorso la "Immobiliare Fiorenza" originariamente coinvolta, è definitivamente confluita nella " Immobiliare C. E. 2000 S.r.l." sempre con sede a Vobarno in via Provinciale 80.

7.E' infine necessaria una certa tolleranza per portare a termine - senza fastidiosi contenziosi - una vicenda piuttosto tribolata, che comporta comunque una dose di "mediazione ventennale".

B) RIFERIMENTI GENERALI

- Operatori Iniziali: <Immobiliare C. E. 2000 s.r.l.> e <Gabogas 2 s.a.s.> di Vobarno (Brescia);
- Progetto e Direzione Lavori: Ing. Giorgio Mossini iscritto al n° 621 dell' Ordine di Mantova ;
- Impresa Principale : Capiluppi Enzo s.r.l. con sede a Buscoldo di Curtatone (Mantova) .

C) DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

L'intervento riguarda la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, riferite ad una nuova lottizzazione produttiva in Frazione di Campitello – Comparto < Scaina 2 > . In particolare l' intervento da collaudare riguarda i seguenti servizi " a rete " :

- fognature delle acque nere e meteoriche ;
- reti di acquedotto e di metanodotto ;
- rete telefonica e per la forza motrice ;
- rete di pubblica illuminazione ;
- cabina elettrica di trasformazione MT-BT ;
- opere stradali in genere, sistemazioni a verde ed arredo urbano .

D) CARATTERISTICHE DELLE OPERE IN PROGETTO

Le caratteristiche delle opere da verificare sono state desunte dal Progetto approvato , dalle indicazioni della Convenzione Urbanistica sottoscritta e dalle Prescrizioni delle varie Aziende di servizio, che hanno valutato l' intervento in programma. Alle stesse specifiche si farà riferimento nelle successive fasi di accertamento delle opere, fino alla Certificazione Definitiva per consegnare il comparto alla gestione municipale convenzionata.

E) ESPLETAMENTO DEL COLLAUDO DEFINITIVO DELLE OPERE

Le opere di urbanizzazione sono state realizzate in fasi successive e differite, in conseguenza di un periodo di recessione economica generalizzata e persistente da vari anni. Dopo l'iniziale predisposizione delle canalizzazioni sotterranee sono state differite tutte le opere superficiali. Nel frattempo è stata predisposta dal sottoscritto la verifica preliminare delle opere indispensabili per garantire la sicurezza e la funzionalità degli impianti e degli spazi aperti al pubblico passaggio, redigendo un Certificato di Collaudo Tecnico Parziale riguardante in particolare: il regolare esercizio delle reti sotterranee; la disponibilità della forza motrice ; la transitabilità della strada di accesso con relativa segnaletica minimale e la chiusura stabile e visibile dei tratti non ancora transitabili.

F) RISCONTRI CONCLUSIVI - VERBALE DI VISITA DEFINITIVA

Dopo aver controllato gli elaborati del Progetto approvato, il sottoscritto ebbe ad effettuare svariati sopralluoghi in corso d' opera, riferendo periodicamente per iscritto alla Amministrazione e segnalando l'accumularsi dei ritardi, divenuti giustificabili per lunga latitanza degli Acquirenti.

Dopo la recente occupazione di tutti i lotti a disposizione si è portato a termine l'intervento e di conseguenza gli Operatori hanno chiesto lo svincolo definitivo della cauzione residua.

Prima dello svincolo è stata fatto un riscontro in contraddittorio sul posto alla presenza del Direttore dei Lavori ing. G. Mossini in data 07/05/2021, al quale ha presenziato la geom. Consuelo Cadenelli per conto dei Lottizzanti ed il geom. Giuseppe Castagna per conto del Comune.

Individuando ancora alcune indeterminazioni procedurali è stata concordata una risolutiva riunione collegiale presso l'Ufficio Tecnico del Comune, tenutasi in data 07/10/2021. In tale incontro si è convenuto che il Collaudo Definitivo sarebbe stato rilasciato non appena sistemato il piano stradale, localmente disgregato in corrispondenza ai chiusini delle fognature. Questo per concludere una procedura divenuta defatigante per tutti ed atteso che:

-La segnaletica stradale è stata completata da diversi anni ma risulta attualmente sbiadita dalla usura della pluriennale viabilità pubblica. Quindi sarà il Comune a rinnovarla a tempo debito;

-La documentazione " As- Build " richiesta dalla T.E.A. per la pubblica illuminazione e quella per la ubicazione delle linee sotterranee - con il posizionamento esecutivo dei chiusini relativi - verrebbe depositata in Comune dal D. L. ing. Giorgio Mossini al più presto e comunque prima dello svincolo della cauzione residuale.

Nel corso dei vari sopralluoghi in corso d' opera si sono fatti accertamenti " a vista " nelle ispezioni delle condotte o canalizzazioni interrate, nonché accertamenti sulla situazione degli spazi pubblici interessati. In ordine alle opere realizzate si sono fatti i seguenti riscontri:

1. Cavidotti per distribuzioni delle linee elettriche e telefoniche

   Le linee sono state realizzate come da progetto e sono stati predisposti gli allacciamenti ai vari lotti, in corrispondenza ai pozzetti, dotati di chiusini in ghisa con la scritta del servizio relativo ;

2. Cabina elettrica di trasformazione

   E' stata verificata la presenza e funzionalità del nuovo manufatto in c. a. E' già stata recepita in Comune la Agibilità definitiva della costruzione, posta in uso all' Ente Gestore ENEL ;

3. Rete fognante delle acque meteoriche

   Si è constatato il regolare deflusso delle acque meteoriche verso il recapito, con raccolta a mezzo di caditoie sifonate (a vaschetta in p.v.c.) al margine delle carreggiate. Verrà consegnato in Comune il rilievo plano-altimetrico esecutivo dei pozzetti effettivamente eseguiti, posizionati rispetto ai confini (con supporto informatico dwg) ;

4. Rete fognante delle acque nere

   E' stato eseguita da T.E.A. s.p.a. la prova di tenuta delle tubazioni sotto-pressione e la prova di scorrimento, riscontrando un esito positivo. Viene allegato in calce l' attestato della prova di regolarità. Anche in questo caso servirà per il Comune il rilievo "As- Build"

5. Pavimentazioni stradali

   Le pavimentazioni delle strade e della pista ciclabile si presentano in buone condizioni manutentive. E' stato asfaltato l' allargamento della strada principale di accesso dalla Sabbionetana, ove sono rimasti alcuni modesti avvallamenti pregressi sulla corsia già esistente. La segnaletica verticale è soddisfacente; quella orizzontale risulta usurata dal tempo e dalla remota apertura al traffico. Si è convenuto che la ripresa della segnaletica orizzontale sarà presa in carico dal Comando della Polizia Municipale.

6. Rete del gas metano

   La rete del metano è stata installata direttamente sotto il controllo dalla Società di Gestione incaricata dal Comune, secondo specifiche di qualità e protocolli aziendali vincolanti. Pertanto tale servizio si ritiene già conforme alla regola dell' arte e viene escluso dal

seguente accertamento finale. Si allega in calce il Certificato di Conformità finale rilasciato dalla Ditta installatrice.

9.- Linea dell' acquedotto

La rete idrica e di antincendio è stata installata direttamente sotto il controllo dalla Società di Gestione incaricata dal Comune, secondo specifiche di qualità e protocolli aziendali vincolanti. Pertanto tale servizio si ritiene già conforme alla regola dell'arte e viene incluso nel seguente accertamento finale. Segue il Certificato di Conformità finale rilasciata dalla Ditta installatrice.

10.- Impianto di pubblica illuminazione

L' impianto per la pubblica illuminazione è stato realizzato come da progetto e risulta in e risulta in esercizio da alcuni anni. E' stato effettuato un riscontro finale con esito positivo da parte di Tea*reteluce* in data 16/12/2021 con prot. n. C00032.

G) CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO DEFINITIVO

- Vista l' Art. 5 della Convenz. Urbanistica del Comune di Marcaria Rep. 3408 del 02/07/2004 ;
- Accertata la soddisfacente esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, necessarie per garantire e completare l' insediamento produttivo delle Ditta interessate al comparto;
- Effettuato un recente sopralluogo collegiale in data 07/05/2021;
- Verificata la definitiva sistemazione del piano stradale disgregato in corrispondenza dei chiusini delle fognature, con una visita autonoma definitiva in data 02 – novembre - 2021;
- In attesa che il D. L. ing. Giorgio Mossini documenti all' Ufficio Tecnico - su supporto informatico dwg - la situazione "As-Buid" delle linee interrate e della pubblica illuminazione;

Il sottoscritto Ing. Paroli Cesare,

iscritto al n° 346 dell'Ordine degli Ingegneri di Mantova,

nominato Collaudatore dal Comune di Marcaria

DICHIARA

che sono collaudabili le opere di urbanizzazioni primaria

nel Piano di Lottizzazione Produttiva " Scaina Due "

CERTIFICA CHE

LE VARIE OPERE DI URBANIZAZZIONE

realizzate per il Comune di Marcaria dai Lottizzanti Interessati agli Insediamenti stessi

SONO DEFINITIVAMENTE COLLAUDATE.

Marcaria; lì: 20 - dicembre - 2021

Visto il Direttore dei Lavori: FIRMATO ING. GIORGIO MOSSINI

Visto Uno dei Referenti del Gruppo Attuatore: FIRMATO ……

IL COLLAUDATORE: FIRMATO ING. CESARE PAROLI



COMUNE di: MARCARIA **PROVINCIA di: MANTOVA**

CERTIFICATO
DI
COLLAUDO TECNICO DEFINITIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVA " SCAINA DUE " A CAMPITELLO
AD INIZIATIVA DELLE DITTE: IMMOB. FIORENZA S.R.L. E GABOGAS 2 S.A.S
(art. N° 5 della Convenzione Urbanistica Rep. n° 3408 in data 02/07/2004

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL COLLAUDO PER LA CONVALIDA DELLE SINGOLE OPERE

All. - 01- Conformità delle reti di distribuzione per Acqua e Gas

All. - 02- Prova di tenuta della massicciata stradale

All. - 03- Collaudo TEA delle fognature separate

All. - 04- Schema di rilievo della rete fognante

All. - 05- Benestare TEA*reteluce* per la Pubblica Illuminazione

All. - 06- Ripresa delle Foto di posizionamento delle condotte

Marcaria; lì: 20 - dicembre - 2021

Visto il Direttore dei Lavori: FIRMATO ING. GIORGIO MOSSINI

Visto Uno dei Referenti del Gruppo Attuatore: FIRMATO ……

IL COLLAUDATORE: FIRMATO ING. CESARE PAROLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Il sottoscritto ***BATTAGLIA GERMANO***, titolare o legale rappresentante dell'impresa ***AQUA VERDE SNC***, operante nel settore ***TERMOIDRAULICO*** con sede in ***PIAZZA CASTELLO*** n. ***10*** comune di ***SOLFERINO*** (prov. ***MN***), tel. ***0376/855076***.

☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di ***MANTOVA***, n. ***01846410205***.

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (1. 8/8/1985, n. 443) di ***MANTOVA*** n. ***54568***, esecutrice dell'impianto ***RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA E GAS LOTTIZZAZIONE AREA PRODUTTIVA "SCAINA 2" IN LOCALITA' CAMPITELLO DI MARCARIA (MN)***

inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da: ***CAPILUPPI ENZO SRL VIA STRADA SANTA, 19/A BUSCOLDO (MN)***, installato nei locali siti nel comune di ***MARCARIA*** (prov. ***MN***), loc. ***CAMPITELLO*** n. *//* scala *//*, piano ***TERRA*** interno *//* di proprietà di *//*, loc. ***CAMPITELLO*** n. *//*comune di ***MARCARIA*** (prov. ***MN***)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto e state realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui e destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da *//*;

☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ***UNI 9737***;

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

☒ schema di impianto realizzato;

☒ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;

☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi:

.....

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data ***20/02/09***.

Il responsabile tecnico
Battaglia.....
(timbro e firma)

Il dichiarante
Battaglia.....
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

DET NORSKE VERITAS

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. 2003-ABG-AE-05980

This is to certify that

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
of

AVK International A/S

Smedeskovvej 40, Bizonvej 1 + 3, Ursusvej 15 + 17, DK-8464 Galten, Denmark

Has been found to conform to the Environmental Management System Standard
DS/EN ISO 14001:2004

This Certificate is valid concerning all activities related to:

**Design and Production of Valves and Valve Accessories.
Marketing and Sales of Valves and Valve Accessories**

Place and date
Aalborg 2006-02-21

This certificate is valid until
2009-02-28

DANAK
Reg.nr. 6001

for the Certification Dept. in
DNV, Danmark A/S

Annette Kromann
for Certification Manager

Certification audit has been performed by Lead Auditor
Jan C. Schmidt

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Appendix 1 and the Periodical Audit Plan may render this certificate invalid.

Det Norske Veritas, Danmark A/S, Certificeringsafdelingen
Vandmanden 36, DK-9200 Aalborg SV
Tel.: +45 99 33 17 40, Fax.: +45 99 33 17 01

DANAK
Reg.nr. 6001

Certificate No.
2003-ABG-AE-05980
issued by
Det Norske Veritas, Danmark A/S
Certification Dept.

Appendix No.: 1, Certification Conditions.

GENERAL

The client is to keep Det Norske Veritas informed of any significant changes in its Environmental Management System, and other conditions that may affect the environment.

The client is at any time to give Det Norske Veritas admittance and assistance in auditing and surveillance of:

- The Environmental Management System description, including procedures and instructions, and its implementation.
- The production process, equipment, execution of services, facilities and personnel covered by this certification.
- Environmental records and statistics.
- Environmental authorisation and other communication from Environmental Inspection Authorities.

RENEWAL OF CERTIFICATE

The Client is to apply for renewal of the Certificate of Conformity at least three (3) months before the period of validity expires.

SUSPENSION/WITHDRAWAL OF CERTIFICATION

If the Client should fail to fulfil the conditions of Certification, Det Norske Veritas may suspend/withdraw the Certificate of Conformity at any time by written notification, as outlined in Det Norske Veritas, Danmark A/S' Certification Note No. 1.3/DK.

PUBLICATION

This Certificate is published in the national list for valid Management System Certificates issued by Det Norske Veritas, Danmark A/S.

HOLDERS DOCUMENTATION

Environmental Manual: According to Manual, dated 6th January 2006.

Performed Audit Report: DNV Report, dated 19th January 2006.

PERIODICAL AUDITS

The Environmental Management System will periodically be audited by Det Norske Veritas according to the agreed Periodical Audit Plan No.: 2003-ABG-AE-05980, attached. The Certificate is not valid unless scheduled periodical audit has been performed.

Det Norske Veritas will contact the certificate-holder to agree on suitable time for periodical audit within the specified time intervals.

Lead	Periodical Audit to be performed according to the Periodical Audit Plan No.: 2003-ABG-AE-05980							
Auditor	1	2	3	4	5	6	7	8
Date								
Sign.								

Date: 2006-02-21

Client

for Certification Manager
Det Norske Veritas, Danmark A/S

AVK INTERNATIONAL A/S
Smedeskovvej 40, DK-8464 Galten, Denmark

Det Norske Veritas, Danmark A/S, Certificeringsafdelingen
Vandmanden 36, DK-9200 Aalborg SV
Tel.: +45 99 33 17 40, Fax.: +45 99 33 17 01

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity

n° 763 / 2006 — Rev. 1

Prodotti *Products*	**Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili** ***Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels***
Gamma di prodotti *Range of products*	**PE 80 - MOP 5 - SDR 11 - S 5: dal DN/*from DN* 20 al DN/*to DN* 630** **PE 80 - MOP 3 - SDR 17 - S 8: dal DN/*from DN* 40 al DN/*to DN* 630** **PE 80 - MOP 2 - SDR 26 - S 12,5: dal DN/*from DN* 160 al DN/*to DN* 630** Codice dei compound utilizzati */ code of usable compounds:* E5, VE5, DW2, 03, B40, F10, HP1, VE4
Norma *Standard*	**UNI ISO 4437 : 1988 + D.M. 11/99**
Nome commerciale *Trade name*	**DERIPLAST GAS**
Produttore *Manufacturer*	**DERIPLAST SPA**
Sede legale *Head office*	**VIA SAN LEONARDO, 2 — 45010 VILLADOSE (RO)**
Sito produttivo *Production site*	**VIA SAN LEONARDO, 2 — 45010 VILLADOSE (RO)**

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili.
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **119**.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/09/2007**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 119.
This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2007.

Milano, 28/09/2006

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it
Il Presidente
(dr. Graziano Vidotto)

SINCERT
SGQ n°005A
SGA n°014D
PRD n°006B
ISP n°004E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

DET NORSKE VERITAS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.1998-ABG-AQ-05030

This is to certify that

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
of

AVK International A/S

at

Smedeskovvej 40, Bizonvej 1 + 3, Ursusvej 15 + 17, DK-8464 Galten, Denmark

Has been found to conform to the Quality Management System Standard
DS/EN ISO 9001:2000

This Certificate is valid for the following product or service ranges:

**Design and Production of Valves and Valve Accessories.
Marketing and Sales of Valves and Valve Accessories**

Place and date
Aalborg 2006-02-21

for the Certification Dept. in
DNV, Danmark A/S

Annette Kromann
for Certification Manager

DANAK
Reg.nr. 5001

This certificate is valid until
2009-02-28

Certification audit has been performed by Lead Auditor
Jan C. Schmidt

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity

n° 785 / 2006 — Rev. 0

Prodotti *Products*	**Tubi di polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione dell'acqua** ***Polyethylene (PE) pipes for piping systems for water supply***
Gamma di prodotti *Range of products*	**PE 100 - SDR 7,4 - S 3,2 - PN 25: dal DN/*from DN* 20 al DN/*to DN* 450** **PE 100 - SDR 11 - S 5 - PN 16: dal DN/*from DN* 20 al DN/*to DN* 630** **PE 100 - SDR 17 - S 8 - PN 10: dal DN/*from DN* 50 al DN/*to DN* 1000** **PE 100 - SDR 26 - S 12,5 - PN 6: dal DN/*from DN* 160 al DN/*to DN* 1200** Codice dei compound utilizzati */ code of usable compounds:* E3, E6, E10, RQC, VE6, B9L, Fx per spessori */ for wall thikness* e ≤ 32 mm E3, E6, E10, RQC, VE6, B9L, Fx per spessori */ for wall thikness* e > 32 mm
Norma *Standard*	**UNI EN 12201-2 : 2004**
Nome commerciale *Trade name*	**DERIPLAST**
Produttore *Manufacturer*	**DERIPLAST SPA**
Sede legale *Head office*	**VIA SAN LEONARDO, 2 — 45010 VILLADOSE (RO)**
Sito produttivo *Production site*	**VIA SAN LEONARDO, 2 — 45010 VILLADOSE (RO)**

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili.
Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **119**.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/09/2007**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 119.
This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/09/2007.

Milano, 20/09/2006

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it
Il Presidente
(dr. Graziano Vidotto)

SINCERT
SGQ n°008A
SGA n°014D
PRD n°006B
ISP n°004E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

MOD 37 - Rev 4

INAIL INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER STATO DI AVANZAMENTO DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 01/12/2009

Raccomandata AR

Spett.le AQUA VERDE S.N.C. DI GRAZIANO CAVALETTI E C.
PIAZZA CASTELLO, 10
46040 Solferino (MN)

Protocollo documento n.	8403862	del	01/12/2009
Riferimento	7205/09	del	08/07/2009
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20090648821994

Denominazione/ragione sociale	AQUA VERDE S.N.C. DI GRAZIANO CAVALETTI E C.		
Sede legale	PIAZZA CASTELLO, 10 46040 Solferino (MN)		
Sede operativa	PIAZZA CASTELLO 10 46040 Solferino (MN)		
Codice Fiscale	01846410205	E-mail	info@aquaverde.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Metalmeccanica		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.P.S. - Sede di MANTOVA

[X] E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 4502993763

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 01/12/2009

[ ] E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento

FRASCA MARINA

[X] I.N.A.I.L. - Sede di MANTOVA

[X] E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 4296393

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/12/2009

[ ] E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento

CANIGLIA CARLO COSIMO

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale MANTOVA lì 09/12/2009

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede Inail di MANTOVA
CARLO COSIMO CANIGLIA

Camera di Commercio
Mantova

Prot.:CEH/667/2010/EMN9191 17/2/2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01846410205
del Registro delle Imprese di MANTOVA
data di iscrizione: 30/03/1998

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/03/1998
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 28/04/1998
con il numero Albo Artigiani: 54568

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 202892

Denominazione: AQUA VERDE S.N.C. DI GRAZIANO CAVALETTI E C.

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Sede:
CAVRIANA (MN) STRADA MIRABELLA, C.M. CAP 46040

Costituita con atto del 17/02/1998

Durata della società:
data termine: 31/12/2050
con proroga tacita ogni 5 anni

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, LA INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, IL COMMERCIO DI MATERIALE IDRAULICO, IL COMMERCIO DI ARTICOLI DI ARREDAMENTO E ACCESSORI DA GIARDINO.
ESSA POTRA', INOLTRE, SVOLGERE ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA ED ATTIVITA' DI ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI, DI AZIENDE, COMPLESSI INDUSTRIALI E RAMI D'AZIENDA.
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.LGS. N. 385/93, D.LGS. N. 415/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI, ANCHE INDIRETTAMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO, IN VIA OCCASIONALE, DI FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE 197/91.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:
ART. 6) LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' SPETTANO A TUTTI I SOCI CON FIRMA FRA DI LORO DISGIUNTA; AL SOCIO GANDINI GIORGIO SPETTA LA FIRMA PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Camera di Commercio
Mantova

Prot.:CEU/667/2010/BMN9191 17/2/2010

ALLO STESSO SOCIO GANDINI GIORGIO E' CONFERITA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' AVANTI AI TERZI ED IN GIUDIZIO.
AI FINI DI OGNI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI, ED IN PARTICOLARE I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.C.I.A.A., A.S.L. ED ISPETTORATO DEL LAVORO E PER TUTTO CIO' CHE RIGUARDA LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008, VIENE NOMINATO UNICO RESPONSABILE IL SOCIO GANDINI GIORGIO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Valore nominale dei conferimenti in EURO 619,74

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/02/1998

Attività esercitata nella sede legale:
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE; INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI;
INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.
IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.
IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTIBUTORE.
COMMERCIO AL MINUTO SU ORDINAZIONE DA CATALOGO DI MATERIALE IDRAULICO, ARTICOLI DI ARREDAMENTO E ILLUMINAZIONE PER GIARDINI, ATTREZZATURA PER GIARDINAGGIO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* GANDINI GIORGIO (rappresentante dell'impresa)
nato a MILANO (MI) il 13/10/1967
codice fiscale: GNDGRG67R13F205M
firma depositata
quota: 206,58 valuta: EURO
- SOCIO AMMINISTRATORE nominato con atto del 17/02/1998

* CAVALETTI GRAZIANO
nato a MANTOVA (MN) il 24/04/1967
codice fiscale: CVLGZN67D24E897F
firma depositata
quota: 206,58 valuta: EURO
- SOCIO AMMINISTRATORE nominato con atto del 17/02/1998
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 18/02/1998

* BATTAGLIA GERMANO
nato a MONTICHIARI (BS) il 20/05/1960
codice fiscale: BTTGMN60E20F471W
firma depositata
quota: 206,58 valuta: EURO
- SOCIO-AMMINISTRATORE nominato con atto del 17/06/1998
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 15/05/2003

Camera di Commercio
Mantova

Prot.:CEW/667/2010/EMN9191 17/2/2010

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale UFFICIO AMMINISTRATIVO
SOLFERINO (MN) VIA DELLE SPADE, 1/10 CAP 46040

Data apertura: 06/12/2000

- Unità locale UNITA' LOCALE DELL' IMPRESA ARTIGIANA
MAGAZZINO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
CAVRIANA (MN) VIA STRADA MIRABELLA, 1 CAP 46040

Attività esercitata:
UFFICIO AMMINISTRATIVO, DEPOSITO AUTOMEZZI E GESTIONE MAGAZZINO

Data apertura: 01/01/2004

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera C
PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.
Data riconoscimento: 16/04/1998 Ente: ALBO ARTIGIANI

2) lettera D
PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.
Data riconoscimento: 16/04/1998 Ente: ALBO ARTIGIANI

3) lettera E
PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.
Data riconoscimento: 16/04/1998 Ente: ALBO ARTIGIANI

RESPONSABILI TECNICI:

* CAVALETTI GRAZIANO
nato a MANTOVA (MN) il 24/04/1967
Codice Fiscale: CVLGZN67D24E897F
residente a CAVRIANA (MN) VIA FONTANELLE 11 CAP 46040
- SOCIO AMMINISTRATORE
- RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio di tutte le attivit?
Ente: ALBO ARTIGIANI

* BATTAGLIA GERMANO
nato a MONTICHIARI (BS) il 20/05/1968

Camera di Commercio
Mantova

Prot.:CEW/667/2010/EMH9191 17/2/2010

Codice Fiscale: BTTOMN68E20F471W
residente a CALCINATO (BS) VIA COLOMBERINO 8 CAP 25011
- SOCIO AMMINISTRATORE
- RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio di tutte le attivit?
Ente: ALBO ARTIGIANI

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIA IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 29/09/1973 N. 601 ARTT. 15 E 16 PER LE OPERAZIONI DI CREDITO. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE.

PER IL CONSERVATORE
(DOTT.SSA ELENA SPAGNA)

PINA DE ANGELIS

*** fine certificato *** Pina De Angelis

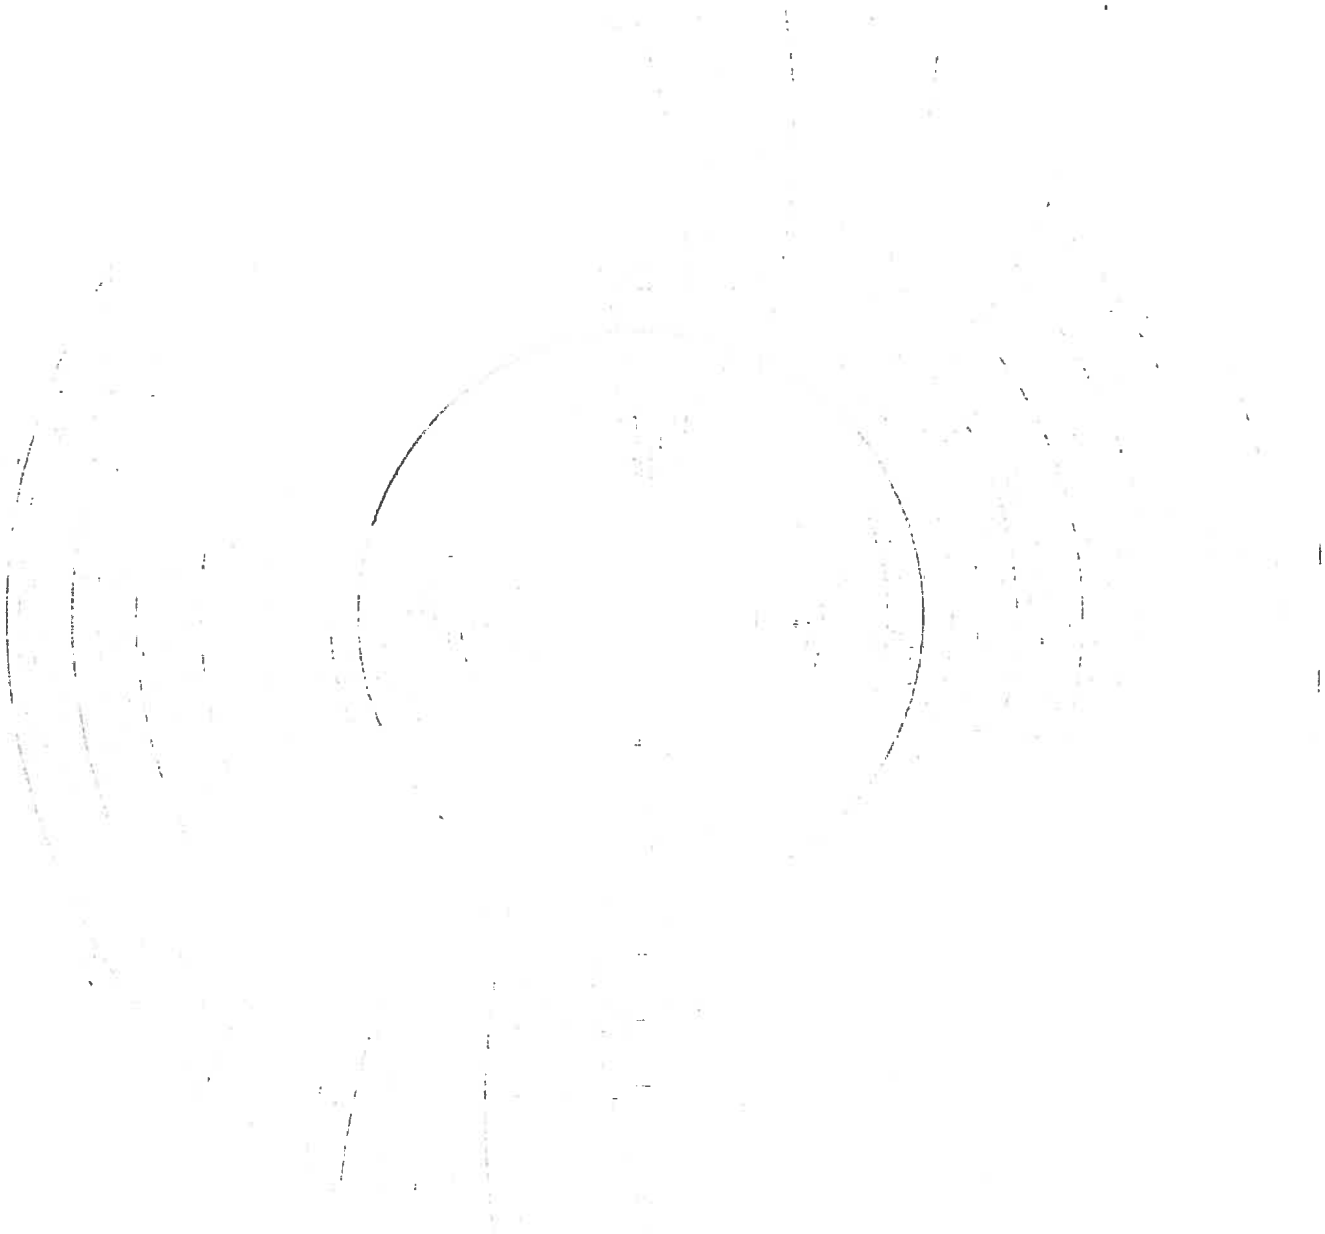

CAMPITELLO GAS

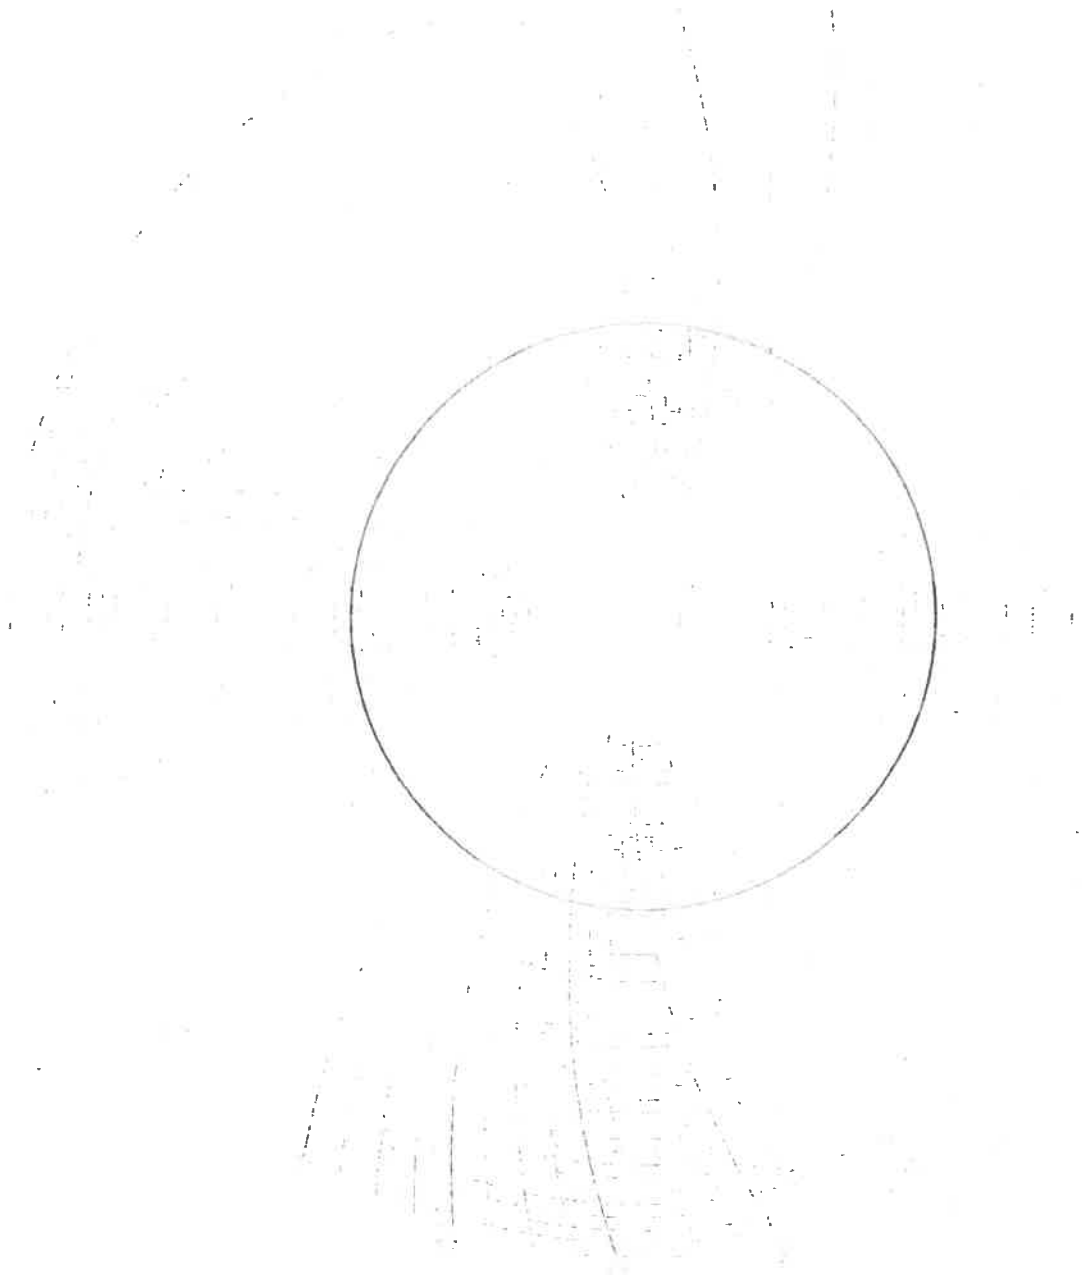

CAPITOLO ACQUA

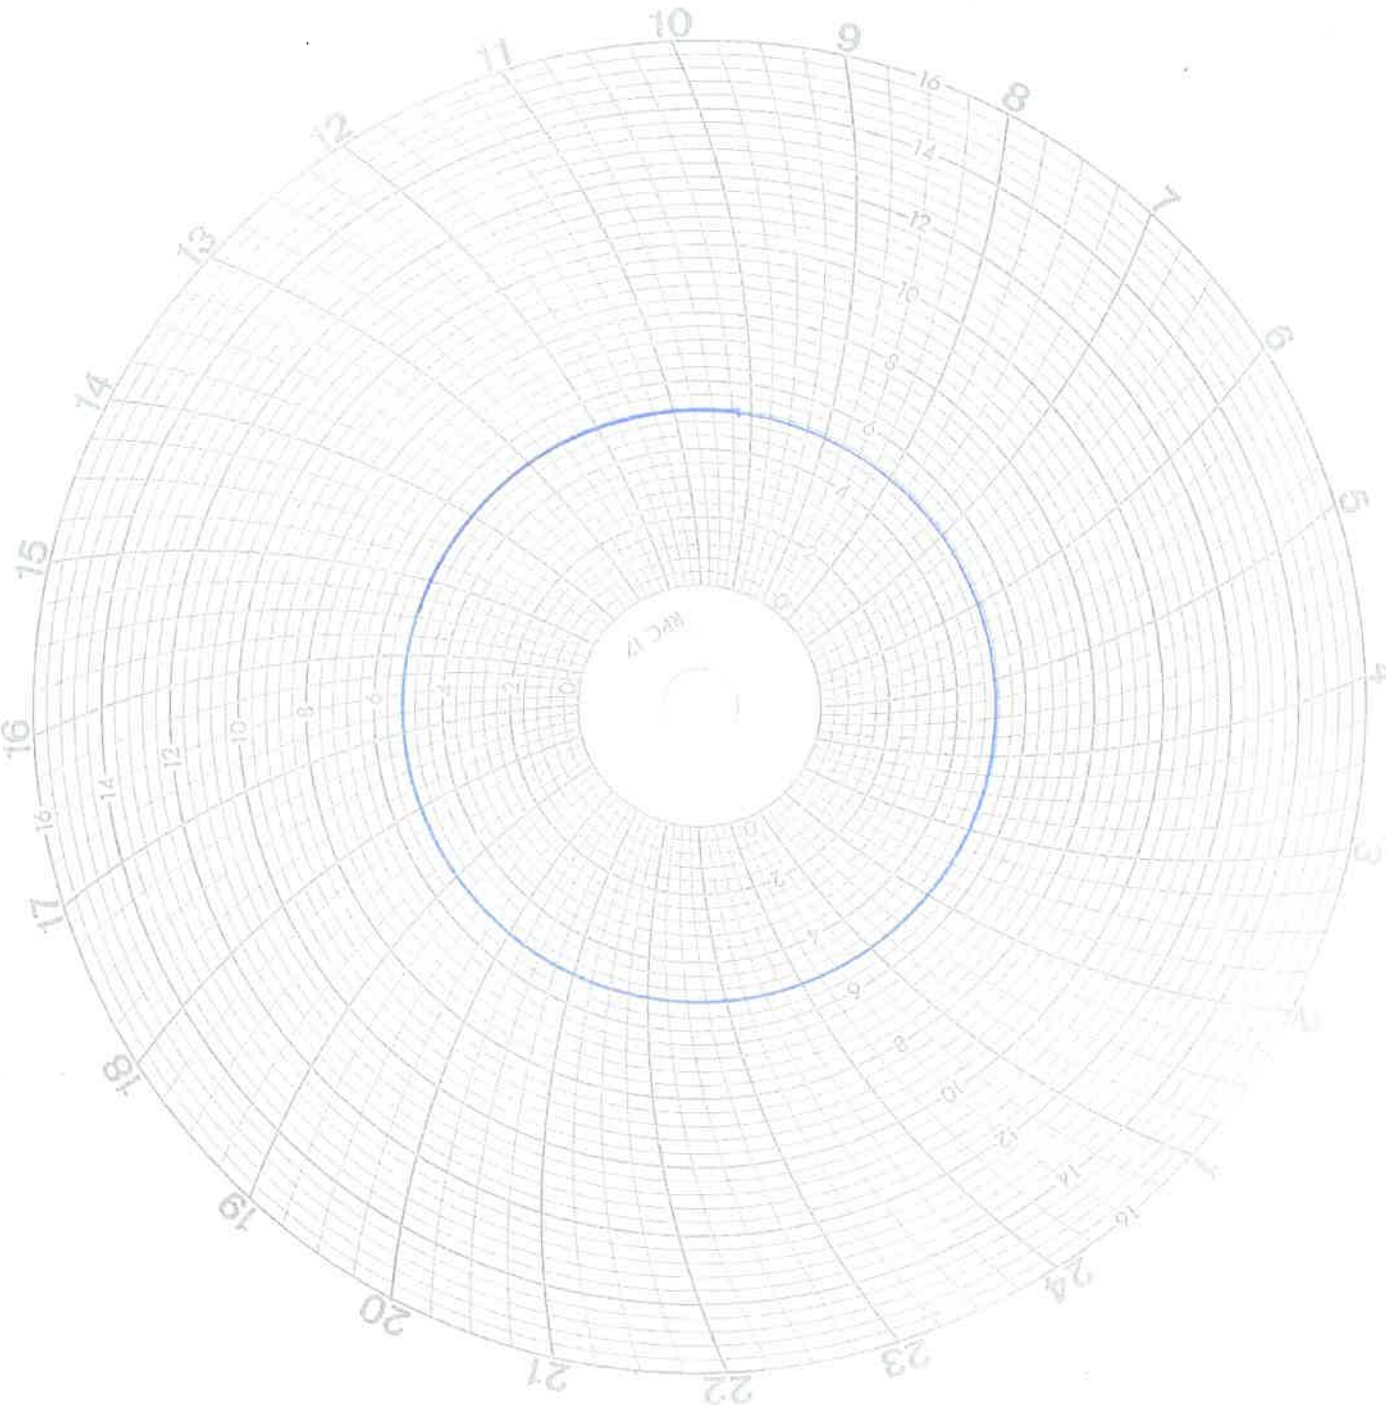
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

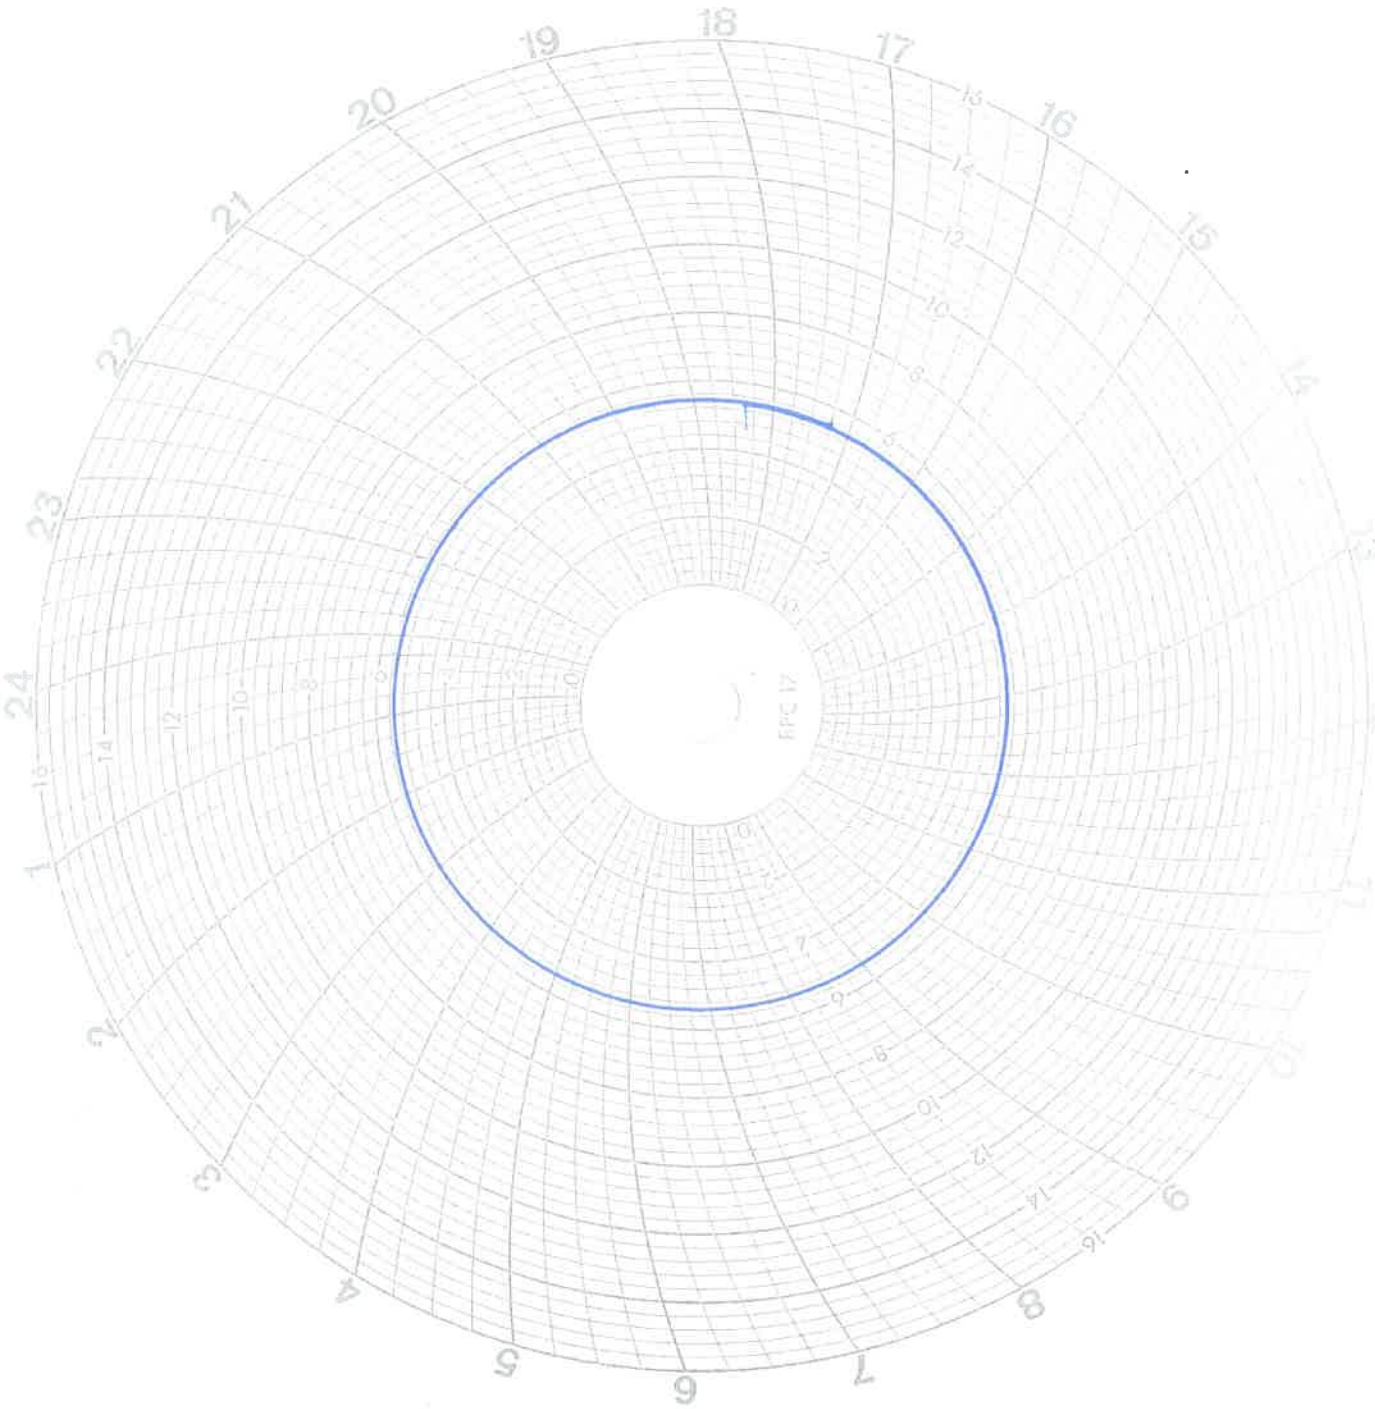
18
19
17
20
16
21
15
22
14
23
13
24
12
1
11
2
10
3
9
4
8
5
7
6

CAPITOL
AVE

L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano s.r.l.

Via A. Pitentino, 10
46010 Levata di Curtatone (MN)
Tel. 0376 291712 - Fax 0376 293042
e-mail: info@labtecman.com

C.F. E P.I. 0129311 020 9
Capitale Sociale € 11.440 i.v.
Registro Imprese di Mantova

SEZIONE GEOTECNICA

PROT. N. 596B/10
Verbale di accettazione N. 215B/10 del 15/06/10

Mantova, 22/06/10

RAPPORTO DI PROVA

Dati dichiarati dal committente

Committente	CAPILUPPI ENZO s.r.l.
Indirizzo	Strada Santa, 18/A - Buscoldo MN
Cantiere	Campitello di Marcaria(MN) - Lottizzazione Scaina 2
Prova richiesta	Prova di carico su piastra (C.N.R. B.U. 146)
Punto di prova	1 - 1° STRADA SX DELLA PR 4° PALO ILLUMINAZIONE 74 mt.
Natura del materiale	Inerte Riciclato

PROVA DI CARICO SU PIASTRA (C.N.R. B.U. 146)

Piastra utilizzata: Ø 300 mm

1° CICLO	
Carico N/mm²	**Cedimenti medi mm**
0,05	0,11
0,15	0,36
0,25	0,56
0,35	0,73

Md (0,15 - 0,25) : 150,0 N/mm²

2° CICLO	
Carico N/mm²	**Cedimenti medi mm**
0,05	//
0,15	//
0,25	//

M'd (0,15 - 0,25) : // N/mm²

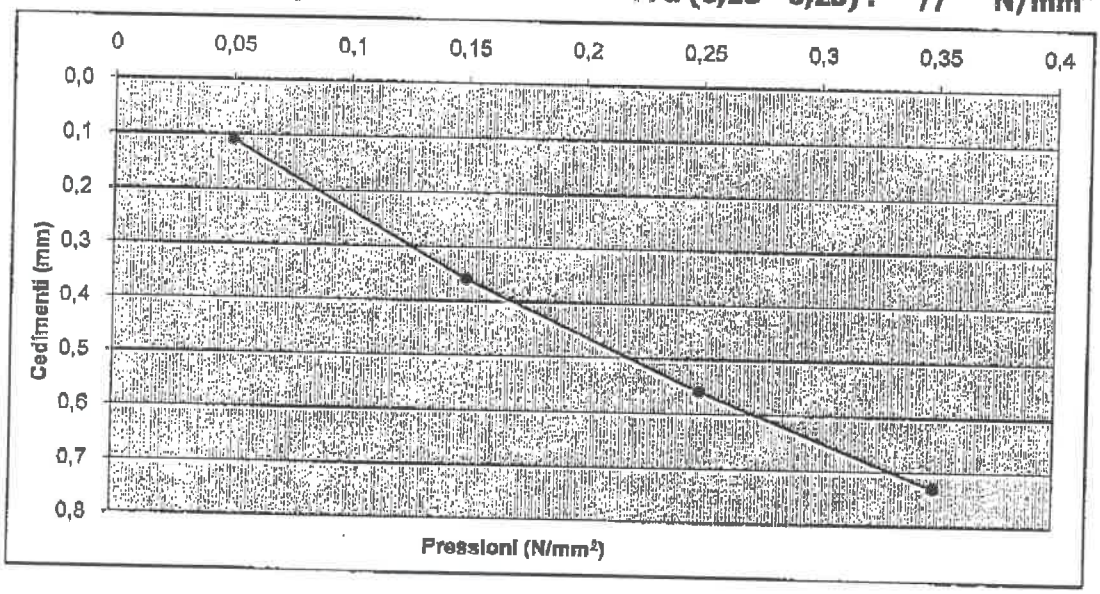

Grado di costipamento dello strato in esame Md/M'd : //
Temperatura dell'aria durante la prova: 28 °C
Umidità del terreno **w:** 1,8 % (UNI CEN ISO/TS 17892-1)
Granulometria del terreno conforme a quanto indicato in C.N.R. B.U. 146
OSSERVAZIONI: Il Committente richiede l'applicazione del solo primo ciclo di carico

Attrezzatura utilizzata: Attrezzature per prova di carico su piastra G094 - Comparatore cod. G095 - Termometro cod. G011
Le prove sono state effettuate in data 11/06/2010

Il presente rapporto di prova non è riproducibile, neppure parzialmente, senza autorizzazione scritta del Laboratorio.
Gli esiti in esso contenuti si riferiscono ai soli campioni sottoposti a prova

Il Tecnico Sperimentatore
Zulejca Bellani

Il Direttore del Laboratorio
dott. ing. Giuliano Ferrari

L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano s.r.l.

Via A. Pitentino, 10
46010 Levata di Curtatone (MN)
Tel. 0376 291712 - Fax 0376 293042
e-mail: info@labtecman.com

C.F. E P.I. 0129311 020 9
Capitale Sociale € 11.440 i.v.
Registro Imprese di Mantova

SEZIONE GEOTECNICA

PROT. N. 597B/10
Verbale di accettazione N. 215B/10 del 15/06/10

Mantova, 22/06/10

RAPPORTO DI PROVA

Dati dichiarati dal committente

Committente	CAPILUPPI ENZO s.r.l.
Indirizzo	Strada Santa, 18/A - Buscoldo MN
Cantiere	Campitello di Marcaria(MN) - Lottizzazione Scalna 2
Prova richiesta	Prova di carico su piastra (C.N.R. B.U. 146)
Punto di prova	2 - VIA ROSSINI INCROCIO STRADA DI LOTTIZZAZIONE
Natura del materiale	Inerte Riciclato

PROVA DI CARICO SU PIASTRA (C.N.R. B.U. 146)

Piastra utilizzata: Ø 300 mm

1° CICLO	
Carico N/mm²	**Cedimenti medi mm**
0,05	0,24
0,15	0,87
0,25	1,47
0,35	1,96

Md (0,15 - 0,25) : 50,0 N/mm²

2° CICLO	
Carico N/mm²	**Cedimenti medi mm**
0,05	//
0,15	//
0,25	//

M'd (0,15 - 0,25) : // N/mm²

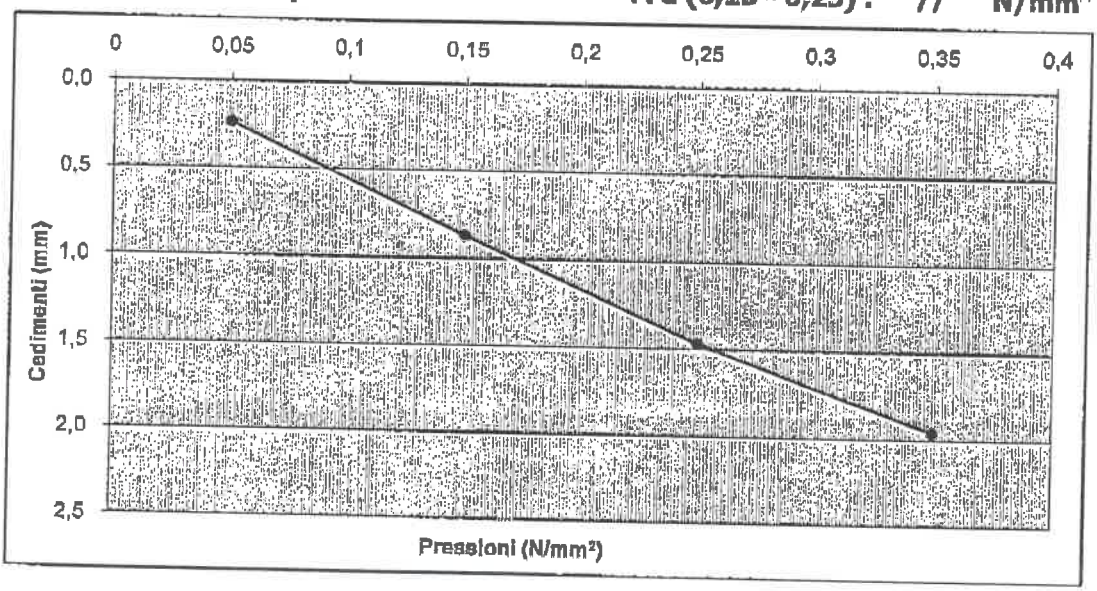

Grado di costipamento dello strato in esame Md/M'd : //
Temperatura dell'aria durante la prova: 29 °C
Umidità del terreno **w:** 2,4 % (UNI CEN ISO/TS 17892-1)
Granulometria del terreno conforme a quanto indicato in C.N.R. B.U. 146
OSSERVAZIONI: Il Committente richiede l'applicazione del solo primo ciclo di carico

Attrezzatura utilizzata: Attrezzatura per prova di carico su piastra G094 - Comparatore cod. G095 - Termometro cod. G011
Le prove sono state effettuate in data 11/06/2010

Il presente rapporto di prova non è riproducibile, neppure parzialmente, senza autorizzazione scritta del Laboratorio.
Gli esiti in esso contenuti si riferiscono ai soli campioni sottoposti a prova

Il Tecnico Sperimentatore
Zulejka Bellani

Il Direttore del Laboratorio
dott. ing. Giuliano Ferrari

Teaacque srl

Spett.le Comune di Marcaria
v. Crispi, 81
46010 Marcaria (MN)
c.a. arch. Gatti Fabrizio

Mantova, li 07/06/10
Prot. n° ..A981...

OGGETTO: Collaudo reti fognarie lottizzazione denominata "Scaina 2" – sita in Campitello di Marcaria

Il giorno 18-01-10, 26-05-10 e 01-06-10 sono state effettuate prove di tenuta per la linea di fognatura acque reflue nella lottizzazione in oggetto.

Dai certificati consegnati in data odierna risulta che la pressione media di prova utilizzata durante l'intero collaudo è stata di 100 mmbar e la perdita massima tollerata è stata di 15 mmbar. (Normativa di riferimento UNI EN 1610)

Inoltre nelle stesse date il sottoscritto ha effettuato sopralluogo con esito positivo per verifica del rispetto delle prescrizioni impartite al progetto e dello stato manutentivo delle condotte, sia per la rete acque reflue che per la rete acque piovane.

Stante quanto sopra si comunica che restiamo in attesa del rilievo, conforme alle nostre specifiche, di quanto eseguito per la rete fognaria.

Restando a disposizione per chiarimenti, distinti saluti.

Servizio Idrico Integrato
dip. ing. Vito Melara

Teaacque srl • con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Tea s.p.a.
Sede legale via Taliercio 2 - 46100 Mantova
Sede operativa 12, vicolo Stretto 46100 Mantova
tel. 0376 2331 fax 0376 233266

C.S. € 1.820.000,00 i.v.
C.F. RIVA e RI CCIAA
Mantova 02119870208
REA CCIAA Mantova n. 225587
www.teaacque.it

11-06-10 001 001
TEAACQUE SRL
08/06 2010 12:02 FAX 0376412498

COMUNE DI MARCARIA – LOTTIZZAZIONE AREA PRODUTTIVA SCAINA 2









LEGENDA

- – – – – TUBI IN CLS DIAM 30/40
- □ POZZETTI CLS DIM 100x100 LINEA ACQUE BIANCHE
- —·——·— TUBI PVC DIAM 250
- ○ POZZETTI CLS DIM 100x100 LINEA ACQUE NERE

CAPILUPPI ENZO s.r.l.
Strada Santa, 18/A
46010 Buscoldo di Curtatone (MN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01660560200

Mantova, 16-12-2021

Prot. n. **C00032**
Riferimento interno: Michele Toparini

Spett. le
Ufficio Urbanistica Comune di Marcaria
via Francesco Crispi, 81
46010 - Marcaria

e p.c.
Comune di Marcaria
Ufficio Protocollo
Via F. Crispi, CM

Oggetto: pratica di verifica tecnica relativa alla presa in gestione dell'impianto di illuminazione per l'opera "PL Scaina 2 " nel Comune di Marcaria.

Ubicazione dell'impianto sottoposto a verifica:

- **Lottizzazione / Opera: PL Scaina 2**
- **Comune: Marcaria**

Con riferimento all'impianto in oggetto,

- vista la documentazione tecnica consegnata;
- verificata la rispondenza e la conformità delle caratteristiche, delle quantità e della documentazione, alle "PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" come da check list che segue:

DOCUMENTAZIONE TECNICA	SI	NO	NON APPL.
PROGETTAZIONE IMPIANTO	X		
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	X		
REQUISITI TECNICI			
QUADRI ELETTRICI	X		
REGOLATORI DI FLUSSO			X
DISTRIBUZIONE	X		
PALI DI SOSTEGNO	X		
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	X		
OPERE EDILI	X		
FORNITURA ENTE DISTRIBUTORE			
FORNITURA ENTE DISTRIBUTORE	X		
START-UP IMPIANTO E PROVA DI FUNZIONAMENTO			
START-UP IMPIANTO E PROVA DI FUNZIONAMENTO	X		

In relazione a quanto accertato in data 26 novembre 2021 e per quanto è stato possibile ispezionare con i seguenti controlli e verifiche:

- esame a vista dei componenti nonché della tipologia di montaggio sotto il profilo della sicurezza nei confronti della gestione e della manutenzione;
- prove di funzionalità dei componenti nelle varie condizioni di esercizio;
- verifica dei parametri di regolare funzionamento.

si rilascia, ai soli fini dell'acquisizione in gestione dell'impianto da parte di TeaReteluce, limitatamente alla parte di impianto oggetto della verifica,

ESITO FINALE POSITIVO

Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione la Direzione Lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e l'Impresa ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi.

Si rimane in attesa di una comunicazione scritta, a cura dell'Amministrazione comunale, per autorizzare la scrivente società ad acquisire in gestione la rete collaudata. Dal ricevimento di tale comunicazione, Tea reteluce srl si farà carico della gestione della rete.
Si fa presente all'Amministrazione comunale, che trascorsi **60 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, la pratica verrà archiviata.

Restando a disposizione per chiarimenti, distinti saluti.

Tea reteluce srl
Amministratore delegato
Bonfietti Davide
